




01º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG - CONCORRÊNCIA: 001/2022 - PROCESSO: - 338/2022											
OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS											
LOCAIS: RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO											
CONTRATO: 60/22		R\$ 707.158,69		PERÍODO: 01/07/22 A 31/07/2022		DATA DA MEDIÇÃO:		05/08/2022		VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO:	
SALDO CONTRATO:		R\$ 585.191,10		R\$ 707.158,69		R\$ 585.191,10		R\$ 707.158,69		R\$ 121.967,58	
EMPRESA: OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - CNPJ 14.341.694/0001-35											
CNPJ: 14.341.694/0001-35											
ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. SALDO CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA											
1											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA D.26 ARMAZADA COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAS 2" ENRUICIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO/PINTADAS	UND	1,00	R\$ 2.224,78	R\$ 2.224,78	1,00	R\$ 2.224,78	1,00	R\$ 2.224,78		R\$ 0,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	M	20,00	R\$ 103,97	R\$ 2.079,40	20,00	R\$ 2.079,40	20,00	R\$ 2.079,40		R\$ 0,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						R\$ 4.304,18		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA											
2											
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M³	566,00	R\$ 15,96	R\$ 9.033,36	257,89	R\$ 4.115,92	257,89	R\$ 4.115,92	308,11	R\$ 4.917,44
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	414,00	R\$ 71,36	R\$ 29.543,04	188,63	R\$ 13.460,64	188,63	R\$ 13.460,64	225,37	R\$ 16.082,40
			TOTAL DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA						R\$ 17.576,56		
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES											
3											
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	723,00	R\$ 284,26	R\$ 205.519,98	324,00	R\$ 92.100,24	324,00	R\$ 92.100,24	399,00	R\$ 113.419,74
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	32,00	R\$ 399,33	R\$ 12.778,56	20,00	R\$ 7.986,60	20,00	R\$ 7.986,60	12,00	R\$ 4.791,96
			TOTAL TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES						R\$ 100.086,84		
			TOTAL TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES						R\$ 100.086,84		
			TOTAL TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES						R\$ 118.211,70		




01º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG - CONCORRÊNCIA: 001/2022 - PROCESSO: - 338/2022											
OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS											
LOCALS: RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO											
CONTRATO: 60/22	R\$ 707.158,69	PERÍODO: 01/07/22 A 31/07/2022									
SALDO CONTRATO:	R\$ 585.191,10	VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO:	DATA DA MEDIÇÃO:								
EMPRESA: OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - CNPJ: 14.341.694/0001-35		CNPJ:		14.341.694/0001-35							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM											
4	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM). REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPAS EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVADO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	25,00	R\$ 3.507,04	R\$ 87.676,00	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00	R\$ 87.676,00
			TOTAL CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM		R\$ 87.676,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 87.676,00
PAVIMENTAÇÃO											
5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR-2C. AF_11/2019	M²	2.586,65	R\$ 4,81	R\$ 12.441,79	-	R\$ -	-	R\$ -	2.586,65	R\$ 12.441,79
5.1	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	129,33	R\$ 1.962,13	R\$ 253.762,27	-	R\$ -	-	R\$ -	129,33	R\$ 253.762,27
			TOTAL PAVIMENTAÇÃO		R\$ 266.204,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 266.204,06
DRENAGEM SUPERFICIAL											
6	GUIA DE MEIOFIO (10X15X22)CM E SARIETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	678,00	R\$ 135,84	R\$ 92.099,52	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 92.099,52
6.1	GUIA DE MEIOFIO (10X15X22)CM E SARIETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	678,00	R\$ 135,84	R\$ 92.099,52	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 92.099,52
			TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL		R\$ 92.099,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 92.099,52
			VALOR TOTAL GERAL		R\$ 707.158,69		R\$ 121.967,58		R\$ 121.967,58		R\$ 585.191,11
APPROVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG											
CONTRATO: 338/22	EMPRESA: OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA										
Vencimento: 15/08/2022	CLAUDIO JOSÉ DE ALVARENGA FERREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG Nº: 82.184/D										


 João Batista Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - 23261 - D/MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
SERVIÇOS EXECUTADOS - PERÍODO 01/07/22 A 31/07/22
REDE PLUVIAL - RUA PADRE JOSÉ ORIOLO



PALCA DE OBRA

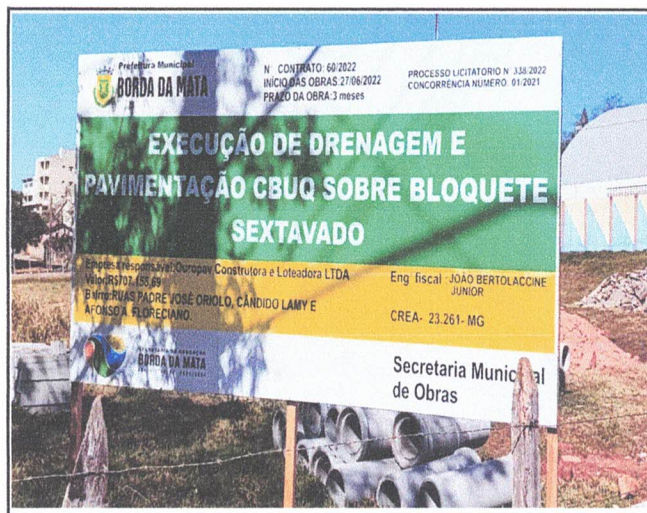

PLACA DE OBRA



ESCAVAÇÃO DE VALAS



ESCAVAÇÃO DE VALAS



ASSENTAMENTO DE TUBOS



ASSENTAMENTO DE TUBOS
