



2ª MEDIÇÃO PARCIAL


Período : 01-08 a 31-08-2.022


OBRA : RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE BLOQUETES SEXTAVADOS
LOCAL : RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO
MEDIÇÃO : 02ª MEDIÇÃO PARCIAL
SERVIÇOS EXECUTADOS : 01/08/22 a 31/08/22
CONTRATADA : OUROPV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA
PROCESSO : 338/2022
CONTRATO : 60 / 2022

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG - CONCORRÊNCIA: 001/2022 - PROCESSO: - 338/2022											
OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS											
LOCALS: RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO											
CONTRATO: 60/22 R\$ 707.158,69 PERÍODO: 01/08/22 A 31/08/2022 DATA DA MEDIÇÃO: 05/09/2022											
SALDO CONTRATO: R\$ 355.131,28 VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO: R\$ 230.059,84											
EMPRESA: OUROPV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - CNPJ 14.341.694/0001-35 CNPJ: 14.341.694/0001-35											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. SALDO CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA											
1											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 5-40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1,00	R\$ 2.224,78	R\$ 2.224,78	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.224,78	-	R\$ 0,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	M	20,00	R\$ 103,97	R\$ 2.079,40	-	R\$ -	20,00	R\$ 2.079,40	-	R\$ 0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 4.304,18				R\$ 4.304,18		R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA											
2											
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M³	566,00	R\$ 15,96	R\$ 9.033,36	197,16	R\$ 3.146,67	455,05	R\$ 7.262,60	110,95	R\$ 1.770,76
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	414,00	R\$ 71,36	R\$ 29.543,04	144,21	R\$ 10.290,83	332,84	R\$ 23.751,46	81,16	R\$ 5.791,58
TOTAL DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA					R\$ 38.576,40		R\$ 13.437,50		R\$ 31.014,06		R\$ 7.562,34
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES											
3											
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	723,00	R\$ 284,26	R\$ 205.519,98	251,00	R\$ 71.349,26	575,00	R\$ 163.449,50	148,00	R\$ 42.070,48
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	32,00	R\$ 399,33	R\$ 12.778,56	12,00	R\$ 4.791,96	32,00	R\$ 12.778,56	-	R\$ 0,00
TOTAL TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					R\$ 218.298,54		R\$ 76.141,22		R\$ 176.228,06		R\$ 42.070,48






02º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG - CONCORRÊNCIA: 001/2022 - PROCESSO: - 338/2022											
OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS											
LOCALS: RUA PE. JOSÉ ORIOLLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO											
CONTRATO: 60/22		R\$ 707.158,69		PERÍODO: 01/08/22 A 31/08/2022		DATA DA MEDIÇÃO:		05/09/2022		VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO:	
SALDO CONTRATO:		R\$ 355.131,28		EMPRESA: OUROPAY CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - CNPJ: 14.341.694/0001-35		VALOR ACUMULADO		14.341.694/0001-35		VALOR SALDO CONTRATO	
R\$ 230.059,84										R\$ 14.028,16	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. SALDO CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM											
4	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	25,00	R\$ 3.507,04	R\$ 87.676,00	21,00	R\$ 73.647,84	21,00	R\$ 73.647,84	4,00	R\$ 14.028,16
				TOTAL CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM		R\$ 73.647,84		R\$ 73.647,84		R\$ 14.028,16	
PAVIMENTAÇÃO											
5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	2.586,65	R\$ 4,81	R\$ 12.441,79	-	R\$ -	-	R\$ -	2.586,65	R\$ 12.441,79
5.1	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	129,33	R\$ 1.962,13	R\$ 253.762,27	-	R\$ -	-	R\$ -	129,33	R\$ 253.762,27
				TOTAL PAVIMENTAÇÃO		R\$ 266.204,06		R\$ 266.204,06		R\$ 266.204,06	
DRENAGEM SUPERFICIAL											
6	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARIETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10% EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	678,00	R\$ 135,84	R\$ 92.099,52	492,00	R\$ 66.833,28	492,00	R\$ 66.833,28	186,00	R\$ 25.266,24
				TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL		R\$ 92.099,52		R\$ 92.099,52		R\$ 25.266,24	
				VALOR TOTAL GERAL		R\$ 707.158,69		R\$ 352.027,41		R\$ 355.131,28	
CONTRATO: 338/22	EMPRESA: OUROPAY CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA										
Vencimento:	 CLÁUDIO JOSÉ DE ALVARENGA FERREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG nº: 82.184/D										
João Bertaccini Júnior APROVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG CREA - 23261 - D MG											





RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Período : 01-08 a 31-08-2.022


OBRA : RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS
LOCAL : RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO
MEDIÇÃO : 02ª MEDIÇÃO PARCIAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS : 01/07/2022
CONTRATADA : OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA
PROCESSO : 338/2022
CONTRATO : 60 / 2022




ESCAVAÇÃO DE VALAS / ASSENTAMENTO TUBOS




ESCAVAÇÃO DE VALAS / ASSENTAMENTO TUBOS

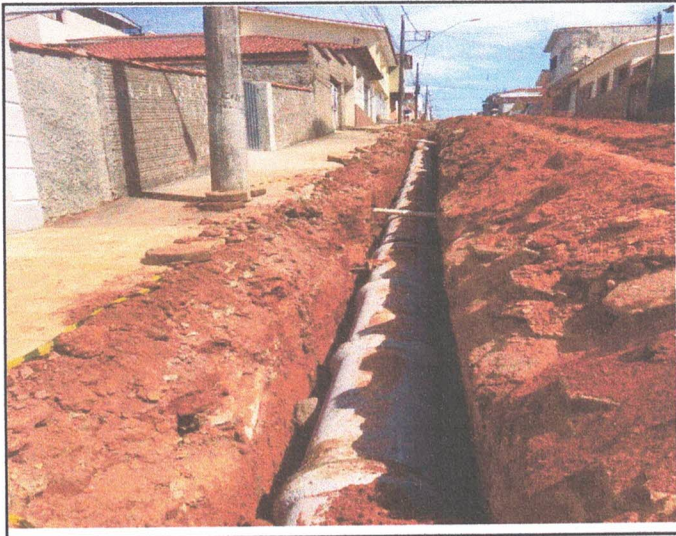

ESCAVAÇÃO DE VALAS / ASSENTAMENTO TUBOS

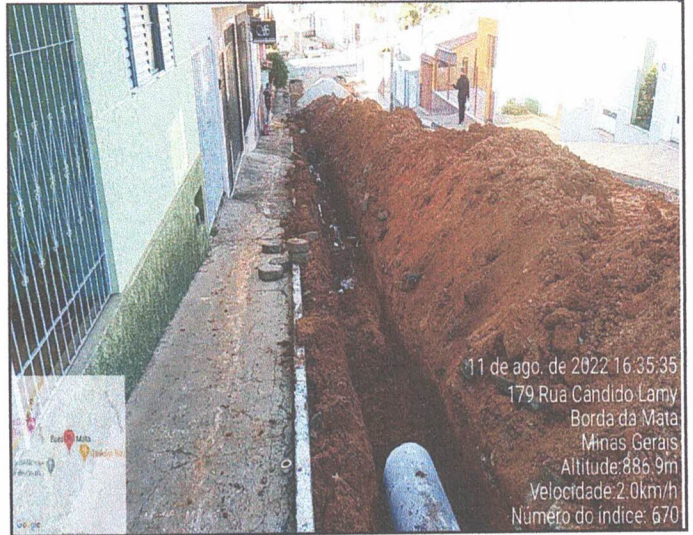

ESCAVAÇÃO DE VALAS / ASSENTAMENTO TUBOS

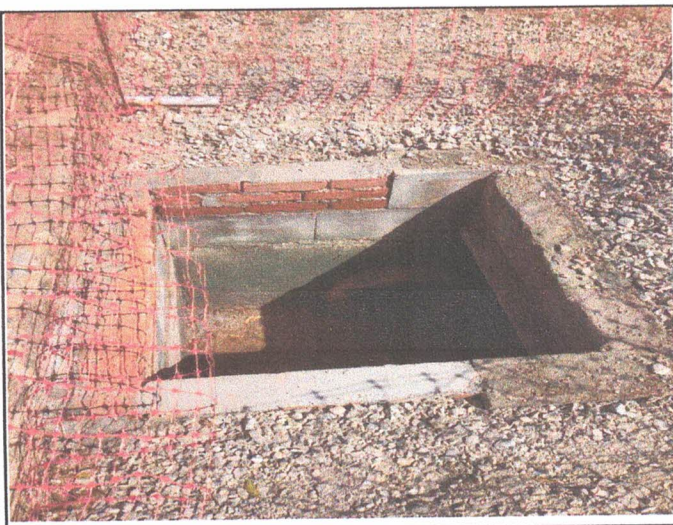

CONFEÇÃO DE CAIXAS COLETORAS



MEIO FIO / SARJETAS
