




3ª MEDIÇÃO PARCIAL

PERÍODO : 01-09-2022 A 30-09-2022

OBRA : RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE BLOQUETES SEXTAVADOS
LOCAL : RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO
CONTRATADA : OUROPAY CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA
PROCESSO : 338/2022
CONTRATO : 60 / 2022

APROVADO	
Data: 18/09/22	Decreto: 1
	
Eng.º. Engenharia	
Prefeitura Municipal	
Borda da Mata	

OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOCOS SEXTAVADOS

LOCALS: RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO

CONTRATO: 60/22 - A

R\$ 838.636,66

PERÍODO: 01/09/22 A 30/09/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 11/10/2022

SALDO CONTRATO:

R\$ 0,25

VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO: R\$ 486.609,00

EMPRESA: OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - CNPJ 14.341.694/0001-35

CNPJ: 14.341.694/0001-35

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. CONTRATO ADITADO	VALOR CONTRATO ADITADO	QUANT DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. SALDO CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA													
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS	UND	1,00	R\$ 2.224,78	R\$ 2.224,78	1,00	R\$ 2.224,78	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.224,78	-	R\$ 0,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	M	20,00	R\$ 103,97	R\$ 2.079,40	20,00	R\$ 2.079,40	-	R\$ -	20,00	R\$ 2.079,40	-	R\$ 0,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		R\$ 4.304,18		R\$ 4.304,18				R\$ 4.304,18		R\$ 0,00
2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA													
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VAJAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M³	566,00	R\$ 15,96	R\$ 9.033,36	566,00	R\$ 9.033,36	110,95	R\$ 1.770,69	566,00	R\$ 9.033,29	-	R\$ 0,00
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VAJA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	414,00	R\$ 71,36	R\$ 29.543,04	414,00	R\$ 29.543,04	81,16	R\$ 5.791,40	414,00	R\$ 29.542,86	-	R\$ 0,00
			TOTAL DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA		R\$ 38.576,40		R\$ 38.576,40		R\$ 7.562,09		R\$ 38.576,15		R\$ 0,00
3 TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES													
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	723,00	R\$ 284,26	R\$ 205.519,98	723,00	R\$ 205.519,98	148,00	R\$ 42.070,48	723,00	R\$ 205.519,98	-	R\$ 0,00
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	32,00	R\$ 399,33	R\$ 12.778,56	32,00	R\$ 12.778,56	-	R\$ -	32,00	R\$ 12.778,56	-	R\$ 0,00
			TOTAL TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		R\$ 218.298,54		R\$ 218.298,54		R\$ 42.070,48		R\$ 218.298,54		R\$ 0,00

APPROVADO

Data: 18/10/22 Decreto: 1

Depto. Engenharia
Prefeitura Municipal
Borda da Mata





03º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG - CONCORRÊNCIA: 001/2022 - PROCESSO: - 338/2022

OBRA: RECAPAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOCOTES SEXTAVADOS

LOCALS: RUA PE JOSÉ OROLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO

CONTRATO: 60/22 - A R\$ 838.636,66 PERÍODO: 01/09/22 A 30/09/2022

SALDO CONTRATO:

R\$ 0,25

DATA DA MEDIÇÃO: 11/10/2022

VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO: R\$ 486.609,00

EMPRESA: OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTADORA LTDA - CNPJ 14.341.694/0001-35

CNPJ: 14.341.694/0001-35

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATADO	QUANT. CONTRATO ADITADO	VALOR CONTRATO ADITADO	QUANT. DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	QUANT. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	QUANT. SALDO CONTRATO	VALOR SALDO CONTRATO	
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM														
4.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBAS)	UND	25,00	R\$ 3.507,04	R\$ 87.676,00	30,00	R\$ 105.211,20	9,00	R\$ 31.563,36	30,00	R\$ 105.211,20		R\$ 0,00	
			TOTAL CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM						R\$ 87.676,00		R\$ 105.211,20		R\$ 105.211,20	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO														
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	M²	2.586,65	R\$ 4,81	R\$ 12.441,79	5.173,30	R\$ 24.883,57	5.173,30	R\$ 24.883,57	5.173,30	R\$ 24.883,57		R\$ 0,00	
5.2	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USIMADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M²	129,33	R\$ 1.962,13	R\$ 253.762,27	181,06	R\$ 355.263,26	181,06	R\$ 355.263,26	181,06	R\$ 355.263,26		R\$ 0,00	
			TOTAL PAVIMENTAÇÃO						R\$ 266.204,06		R\$ 380.146,83		R\$ 380.146,83	R\$ 0,00
DRENAGEM SUPERFICIAL														
6	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SAREIETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBAS)	M	678,00	R\$ 135,84	R\$ 92.099,52	678,00	R\$ 92.099,52	186,00	R\$ 25.266,24	678,00	R\$ 92.099,52		R\$ 0,00	
			TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 92.099,52		R\$ 25.266,24		R\$ 92.099,52	R\$ 0,00
			VALOR TOTAL GERAL						R\$ 707.158,69		R\$ 838.636,66		R\$ 486.609,00	R\$ 0,00
<p>EMPRESA: OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTADORA LTDA</p> <p>CLAUDEJO JOSÉ DE ALVARENGA FERREIRA</p> <p>ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>CREA/MG nº: 92.184/D</p> <p>APROVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG</p> <p>De: 18/10/22</p> <p>Decreto: 1810/22</p> <p>Dcto. Engenharia</p> <p>Prefeitura Municipal</p> <p>Borda da Mata</p>														
<p>CONTRATO: 60/22</p> <p>Vencimento:</p>														



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Período : 01-09 a 30-09-2.022



OBRA : RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE OS BLOQUETES SEXTAVADOS
LOCAL : RUA PE. JOSÉ ORIOLO / RUA CÂNDIDO LAMY / RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO
MEDIÇÃO : 03ª MEDIÇÃO PARCIAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS : 01/07/2022
CONTRATADA : OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA
PROCESSO : 338/2022
CONTRATO : 60 / 2022




PAVIMENTAÇÃO - RUA PADRE JOSÉ ORIOLO



PAVIMENTAÇÃO - RUA PADRE JOSÉ ORIOLO



PAVIMENTAÇÃO - RUA CÂNDIDO LAMY

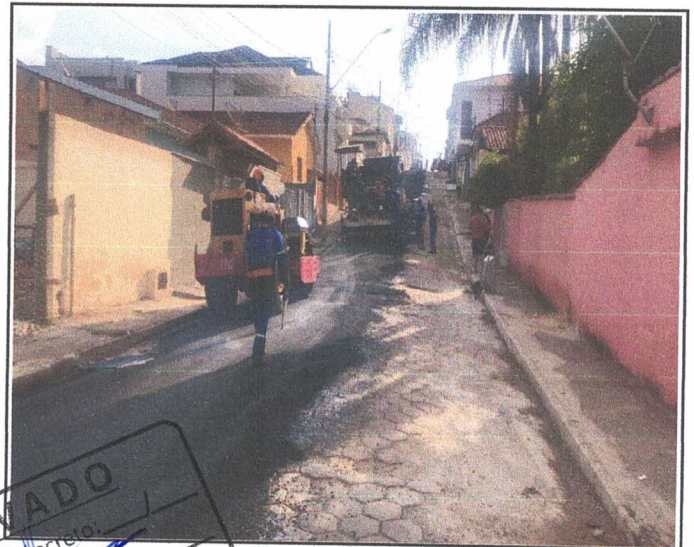

PAVIMENTAÇÃO - RUA CÂNDIDO LAMY

APROVADO
Data: 18/10/22
Depto. Engenharia
Prefeitura Municipal
Borda da Mata



PAVIMENTAÇÃO - RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO



PAVIMENTAÇÃO - RUA PROF. AFONSO A. FLORENCIANO
