



34

**OFÍCIO: Nº 009/2023**

**A(o)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG  
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Referência: PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 000340/2022**

CONTRATO: Nº 067/2022

CONCORRÊNCIA: Nº 003/2022

A empresa RX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.852.645/0001-79, com sede à Avenida José Ribeiro Tristão, nº 2.150 – Bairro Aeroporto, na cidade de Varginha/MG, por meio do seu representante Sr. Fernando Rodrigues Ximenes portador do CPF 876.580.201-25, responsável pela execução do contrato de prestação de serviços de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADO NAS RUAS JOSÉ FELICIANO DE REZENDE, RUA OTÁVIO ORIOLO E RUA JOSÉ DE PAULA MARTINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, vem respeitosamente a presença da V. Sa., requerer análise no boletim de medição anexo deste instrumento no valor correspondente à R\$ 144.899,35 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais, e trinta e cinco centavos)

Nestes termos, pede deferimento.

Borda da Mata/MG, 27 de março de 2023.

**FERNANDO RODRIGUES XIMENES:87658020125** Assinado de forma digital por FERNANDO RODRIGUES XIMENES:87658020125  
Dados: 2023.03.27 16:00:45 -03'00'

RX CONSTRUTORA EIRELI  
Fernando Rodrigues Ximenes  
Sócio Administrador  
CPF: 876.580.201-25 - RG: MG-13.340.423

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

**MEDIÇÃO Nº : 02**  
**PERÍODO: 09/02/2023 a 07/03/2023**  
  
**DATA: 20/03/2023**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
**OBRA:** DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ACCESSIBILIDADE  
**LOCAL:** RUAS JOSÉ DE PAULA MARTINS, OTÁVIO ORIOLO E JOSÉ FELICIANO DE REZENDE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA 003/2022 - PRC 340/2022  
**EMPRESA:** RX CONSTRUTORA LTDA  
**CONTRATO:** CT Nº 067/2022


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS NAS RUAS JOSÉ FELICIANO DE REZENDE, RUA OTAVIO ORIOLO E RUA JOSÉ DE PAULA MARTINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO ANEXO.

**CNPJ:** 11.852.645/0001-79  
**Inscrição Estadual:** 001.611172-0074  
**EXIBIL:** anacaudia@rxconstrutora.com.br,fernando@rxconstrutora.com.br  
**Contatos:** Fernando Rodrigues Ximenes  
**Conta Corrente:** 00100820-1

Item	Código	Discriminação Conforme contrato	Unid.	Quantidade		Preço Unitário (B)	Valor (R\$)		Valor (R\$) Executado Acumulado (A+C)
				Previsão Total (A)	Executada Nesta Medição (C)		Previsão Total (A+B)	Executado Nesta Medição (A+C)	
<b>CEMITERIO MUNICIPAL</b>									
1	II0-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>							
1.1	II0-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIECIDAS COM METALON 20X20, SUPORTE EM ECAUÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.	Unid.	1,00	1,00	1.574,64	1.574,64	1.574,64	1.574,64



1.2	LOC-TOP-005	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UNID.	20,00	107,47	20,00	20,00	2.149,34	-	2.149,34
<b>2</b>	<b>8732</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA</b>								
2.1	TER-ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<=1,50M	M³	102,00	12,00	102,00		1.224,00	-	1.224,00
2.2	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	98,00	50,76	98,00		4.974,48	-	4.974,48
<b>3</b>	<b>9004</b>	<b>TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES</b>								
3.1	DRE-TUB-045	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	135,00	110,33	135,00		14.894,55	-	14.894,55
<b>4</b>	<b>8993</b>	<b>CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM</b>								
4.1	HID-CXS-255	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO M ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	6,00	1.322,07	6,00		7.932,42	-	7.932,42
<b>5</b>	<b>9082</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE</b>								
5.1	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M³	398,00	23,14	316,80	81,20	9.209,72	1.878,97	9.209,72
5.2	TRA-CAR005	CARGA DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL	M³	160,00	43,63	130,00	30,00	6.980,80	1.308,90	6.980,80
<b>6</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
6.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM	M²	1757,30	85,00	416,00	1.341,30	149.370,50	114.010,50	149.370,50
<b>7</b>	<b>DRE-001</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>								
7.1	DRE-SAR-020	GUJA DE MEIO FIO (10X15X22)CM E SARIETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10% EM CONCRETO COM FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	504,00	80,00	255,00	249,00	40.320,00	19.920,00	40.320,00
<b>8</b>	<b>9066</b>	<b>RAMPA DE ACESSO</b>								

Item	Unid.	RAMPA DE ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCR=25MPA DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS	Unid.	14,00	443,31	14,00	14,00	6.206,34	6.206,34	6.206,34	6.206,34
9.1											
<b>TOTAL</b>											
<b>SALDO A RECEBER</b>											
<p>Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação            Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação            Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação            Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação            Quantidade executada em cada medição            Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)</p>											
<p>(AMB) Valor previsto total da planilha            (ANC) Valor executado para cada medição            (AND) Valor executado acumulado (somatório das medições realizadas)</p>											
<p>ANA CLAUDIA <small>Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA IZIDORO:08661533651</small>            IZIDORO:08661533651 <small>Dados: 2023.03.27 11:37:16 -03'00'</small>            51</p> <p>Empreiteira: RX Construtora Ltda            Engenheiro: Ana Cláudia Izidoro            CREA/MG: 204.857/D</p> <p> Prefeitura Municipal de Borda da Mata</p>											





Nº do relatório: 26  
Relatório 07/03/2023

## Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

## Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ( 3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS, EM ESTRUTURA METALICA, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1 UN
DRENAGEM SUPERFICIAL	
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	7 UN

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

## Galeria de Fotos

Av. José Ribeiro Tristão, 2150, Aeroporto, Varginha/MG.

CEP: 37.031-075  
CNPJ: 11.52.645/0001-79  
Inscrição Estadual: 001.61112-0074

www.rxconstrutora.com.br  
atendimento@rxconstrutora.com.br  
35 3221-6919



Nº do relatório: 26  
Relatório 07/03/2023



WhatsApp Image 2023-03-07 at 17.22.46.jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 17.22.46 (3).jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 17.22.46 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 17.22.46 (1).jpeg



Nº do relatório: 25  
Relatório 06/03/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

DRENAGEM SUPERFICIAL	
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	7 UN

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

### Galeria de Fotos

Nº do relatório: 25

Relatório 06/03/2023



WhatsApp Image 2023-03-07 at 10.53.30.jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 10.53.27.jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 10.53.28.jpeg



WhatsApp Image 2023-03-07 at 10.53.30 (1).jpeg



Nº do relatório: 24  
Relatório 24/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	16:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA      0,000 DIA

### Comentários

FOI REALIZADO CORTES NAS RUAS JOSÉ FELICIANO E OTAVIO ORIOLO

Nº do relatório: 23  
Relatório 23/02/2023

### Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	121.7 M2

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Comentários

RUA JOSÉ FELICIANO DE REZENDE

### Galeria de Fotos



Nº do relatório: 23  
Relatório 23/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-23 at 18.08.04.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.20.02 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-23 at 18.07.56.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.20.02.jpeg



Nº do relatório: 22  
Relatório 22/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	110 M2

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA      0,000 DIA

### Comentários

RUA JOSÉ FELICIANO DE REZENDE



Nº do relatório: 21  
Relatório 21/02/2023

### Contratante

**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

DRENAGEM SUPERFICIAL	
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	107 M

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA      0,000 DIA

### Comentários

RUA JOSÉ FELICIANO DE REZENDE



Nº do relatório: 20  
Relatório 20/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL):( AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	81.2 M3
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	30 M3
PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	183.6 M2

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Comentários

RUA OTÁVIO ORIOLO



Nº do relatório: 20  
Relatório 20/02/2023

## Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.20.02.jpeg

Nº do relatório: 19  
Relatório 17/02/2023

### Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável

### Funcionários


Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	16:00

### Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H
	3.507,800 H

### Comentários

NÃO HOUVE EXECUÇÃO POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL





Nº do relatório: 18  
Relatório 16/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

DRENAGEM SUPERFICIAL	
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	70 M

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA 0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H 3.507,800 H

Nº do relatório: 17  
Relatório 15/02/2023

### Contratante

**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H
	3.507,800 H

### Comentários

NÃO HOUE EXECUÇÃO POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL



Nº do relatório: 16  
Relatório 14/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades


PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	226 M2
DRENAGEM SUPERFICIAL	
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	72 M

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso





Nº do relatório: 16

Relatório 14/02/2023

EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA	0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H	3.507,800 H

### Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-14 at 19.03.29.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-14 at 19.03.29 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-14 at 19.03.29 (1).jpeg





Nº do relatório: 15  
Relatório 13/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA      0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H      3.507,800 H

### Comentários

NÃO HOUE EXERCUÇÃO ESS DIA, POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL.



Nº do relatório: 14  
Relatório 10/02/2023

### Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	200 M2

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	16:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	16:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA 0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H 3.507,800 H



Nº do relatório: 13  
Relatório 09/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	500 M2

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDS DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA      0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H      3.507,800 H


### Comentários

RUA JOSÉ DE PAULA MARTINS



Nº do relatório: 13  
Relatório 09/02/2023

## Galeria de Fotos

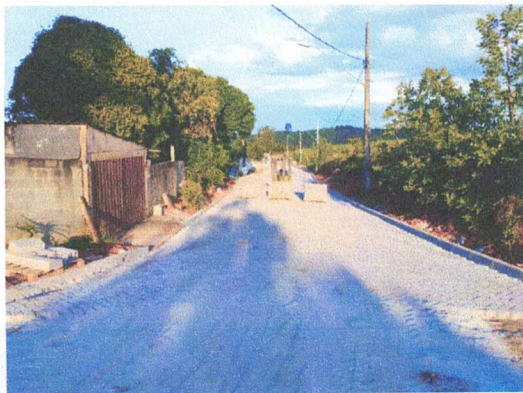

IMG-20230209-WA0429.jpg



IMG-20230209-WA0418.jpg




IMG-20230209-WA0419.jpg



IMG-20230209-WA0421.jpg



Nº do relatório: 13  
Relatório 09/02/2023

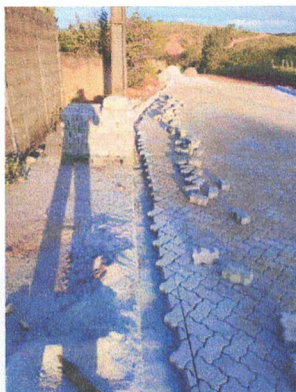

IMG-20230209-WA0420.jpg



IMG-20230209-WA0417.jpg



ANA CLAUDIA  
IZIDORO:08661533651

Assinado de forma digital por ANA  
CLAUDIA IZIDORO:08661533651  
Dados: 2023.03.20 10:20:44 -03'00'

**Contratada**

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79

**Aceite da Contratante**

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75

Av. José Ribeiro Tristão, 2150, Aeroporto, Varginha/MG.

CEP: 37.031-075  
CNPJ: 11.52.645/0001-79  
Inscrição Estadual: 001.61112-0074

www.rxconstrutora.com.br  
atendimento@rxconstrutora.com.br  
35 3221-6919
