

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG											
OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados											
LOCAL: RUA RAUL COBRA, AUGUSTA BRANDÃO E JOSÉ MODESTO.											
CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA						CNPJ 32.091.094/0001-48					
CONTRATO Nº 066/2021											
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2022 a 14/12/2022											
CONTRATO											
R\$ 271.366,39											
SALDO ANTERIOR											
R\$ 271.366,39											
MEDIÇÃO 01											
R\$ 204.785,25											
SALDO											
R\$ 66.581,14											
CONTRATO											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.	UND	1,00	1.213,50	R\$ 1.574,64	R\$ 1.574,64	1,00	R\$ 1.574,64	0,00	R\$ -	
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	UND	20,00	82,82	R\$ 107,47	R\$ 2.149,40	20,00	R\$ 2.149,40	0,00	R\$ -	
2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA										
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50M	M3	185,00	9,25	R\$ 12,00	R\$ 2.220,00	185,00	R\$ 2.220,00	0,00	R\$ -	
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	M3	153,00	39,12	R\$ 50,76	R\$ 7.766,28	153,00	R\$ 7.766,28	0,00	R\$ -	
3	TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES										
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	M	246,00	85,03	R\$ 110,33	R\$ 27.141,18	246,00	R\$ 27.141,18	0,00	R\$ -	
4	CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM										
4.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.(EM CACAMBA)	UN	10,00	1.018,86	R\$ 1.322,07	R\$ 13.220,70	8,00	R\$ 10.576,56	2,00	R\$ 2.644,14	
5	REGULARIZAÇÃO SUB-BASE										



5.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUÍ AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	588,00	17,83	R\$ 23,14	R\$ 13.606,32	588,00	R\$ 13.606,32	0,00	R\$ -
5.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	258,00	33,62	R\$ 43,63	R\$ 11.256,54	258,00	R\$ 11.256,54	0,00	R\$ -
6	PAVIMENTAÇÃO									
6.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.721,60	71,35	R\$ 92,58	R\$ 159.385,73	1171,78	R\$ 108.483,02	549,82	R\$ 50.902,71
7	DRENAGEM SUPERFICIAL									
7.1	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA(30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	525,00	42,00	R\$ 54,50	R\$ 28.612,50	367,18	R\$ 20.011,31	157,82	R\$ 8.601,19
8	RAMPA DE ACESSO									
8.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	10,00	341,64	R\$ 443,31	R\$ 4.433,10		R\$ -	10,00	R\$ 4.433,10
						VALOR TOTAL DO CONTRATO	R\$ 271.366,39	R\$ 204.785,25		R\$ 66.581,14

BORDA DA MATA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022





		<b>Relatório n°</b>	<b>28</b>
		<b>Data do relatório</b>	<b>18/07/2022 - 14/12/2022</b>
		<b>Dia da semana</b>	Segunda-Feira até Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		<b>Contrato</b>	
<b>Obra</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO BORDA DA MATA 066</b>	<b>Prazo contratual</b>	63 dias
<b>Local</b>	RUA RAUL COBRA, AUGUSTA BRANDÃO E JOSÉ MODESTO	<b>Prazo decorrido</b>	63 dias
<b>Contratante</b>	PREFEITURA DE BORDA DA MATA	<b>Responsável</b>	GUILHERM ELIAS DUARTE
		<b>Prazo a vencer</b>	-87 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (4)						
Calceteiro <b>1</b>	ENGENHEIRO CIVIL <b>1</b>	Servente <b>1</b>	TOPOGRAFO <b>1</b>			Terceiros <b>(4)</b>


Equipamentos (0)

Atividades (3)	
ASSENTAMENTO DE TUBOS	Em Andamento
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	Em Andamento
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	Em Andamento


Ocorrências (0)

Comentários (0)





Galeria de Fotos (42)	
	

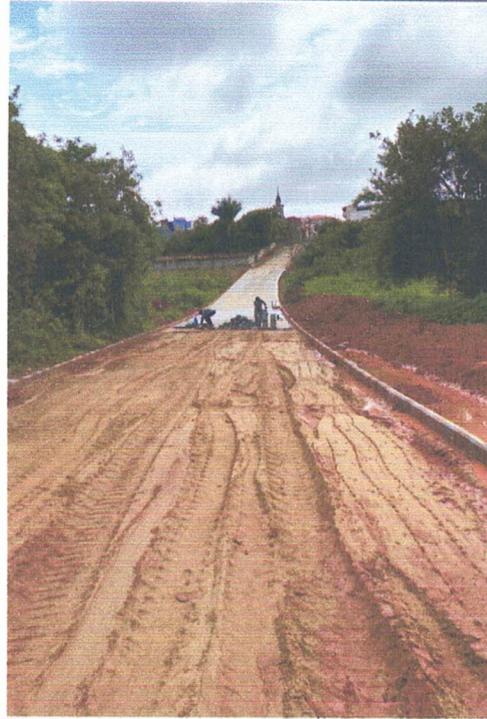


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. V. S.', written in a cursive style.

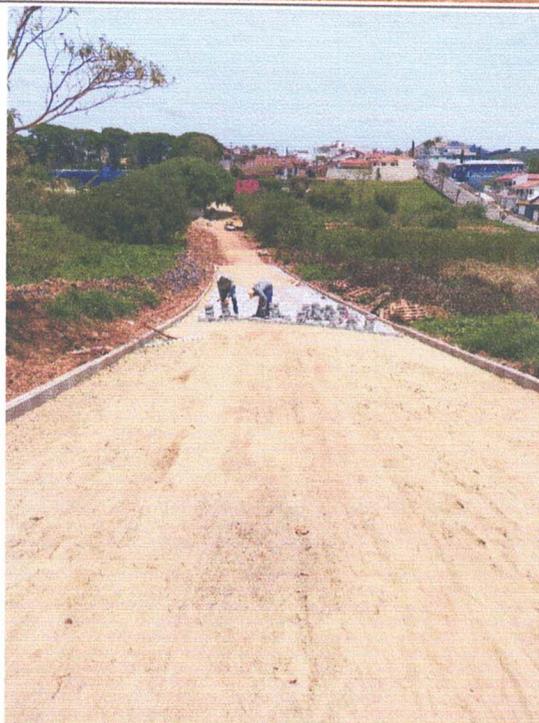



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Silva'.

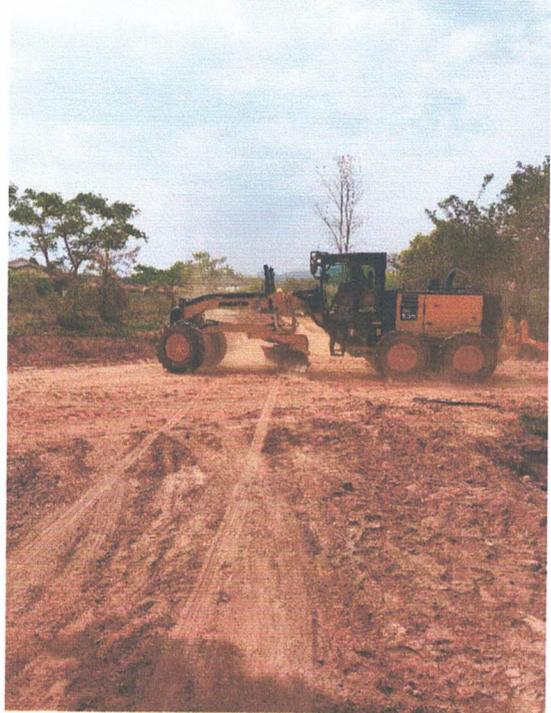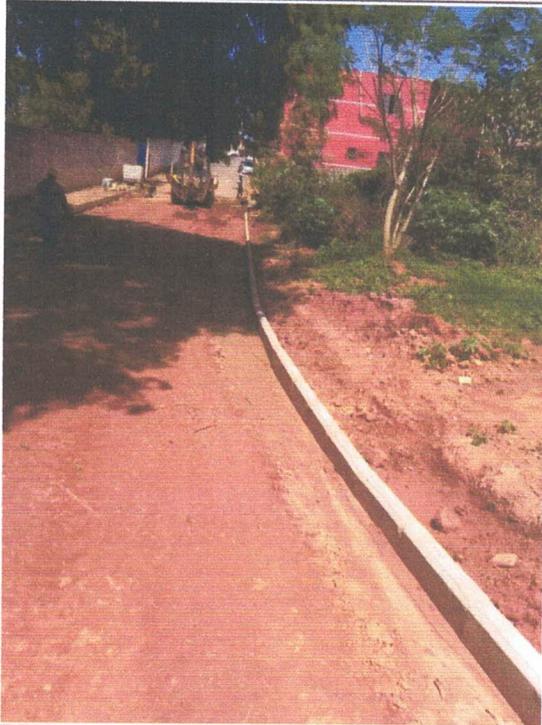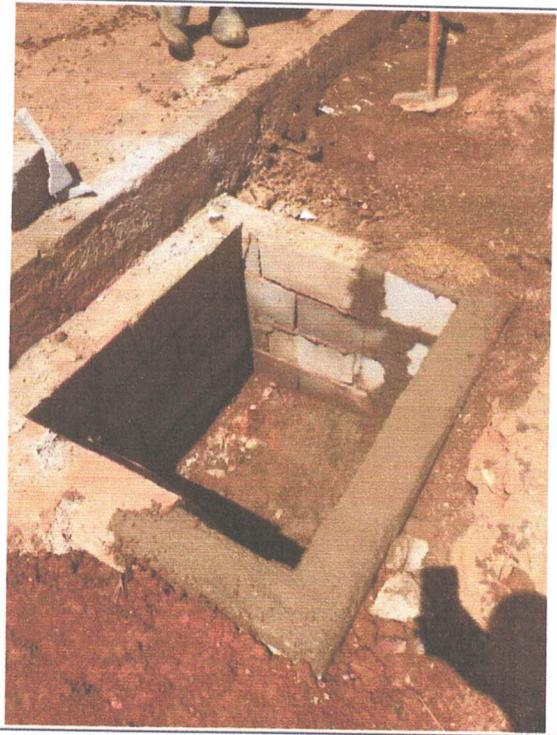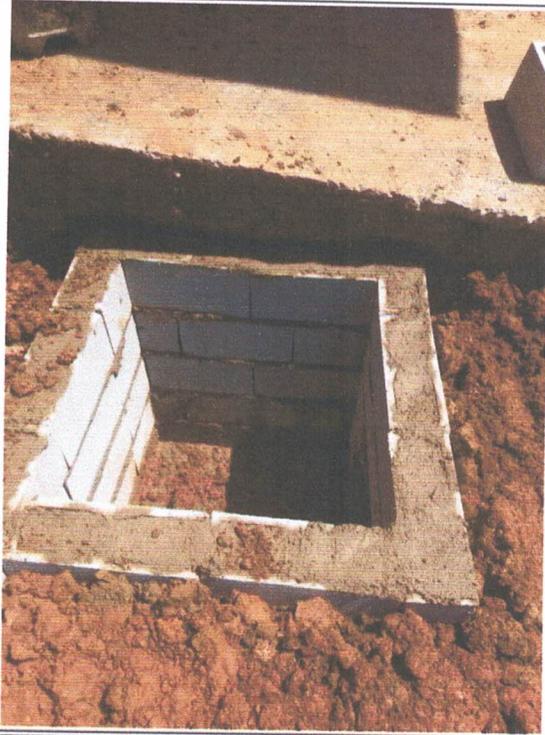




A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Silva'.

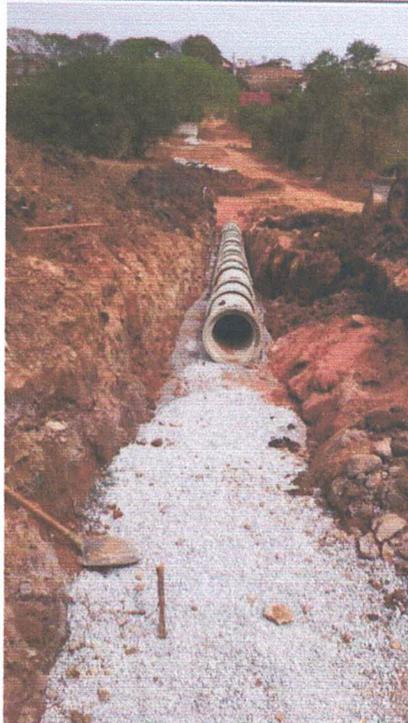



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Wab'.

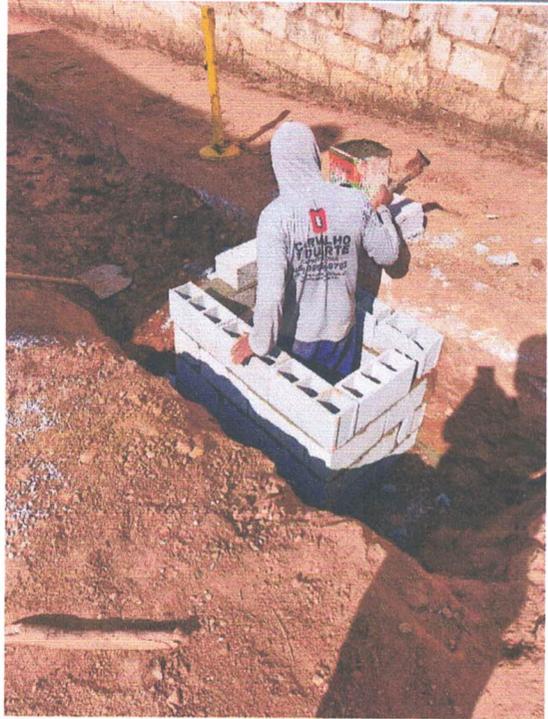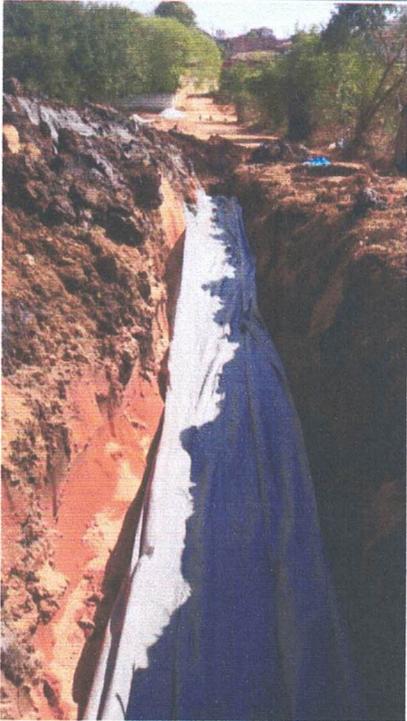


A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be "Raul".

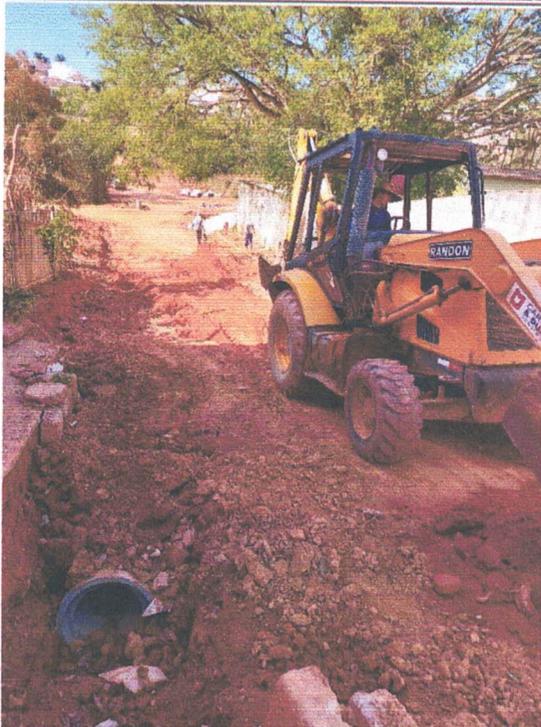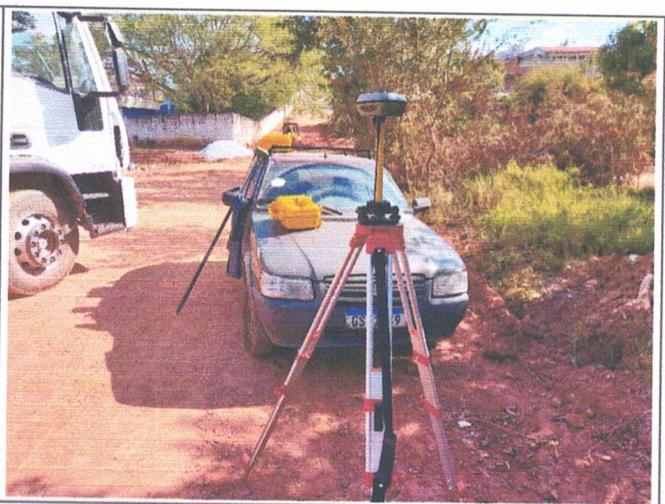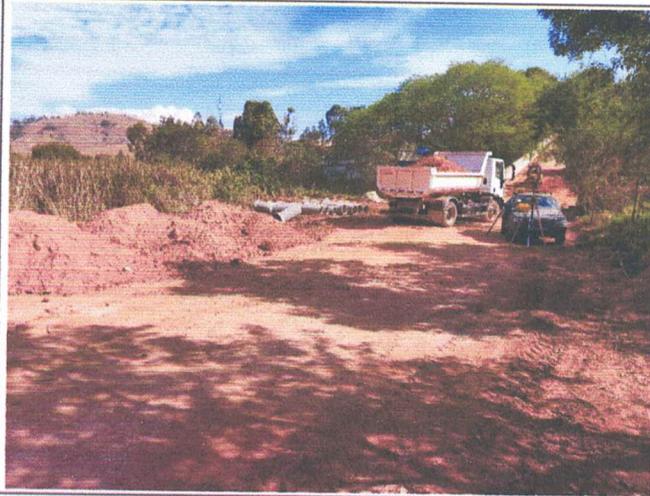



A handwritten signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

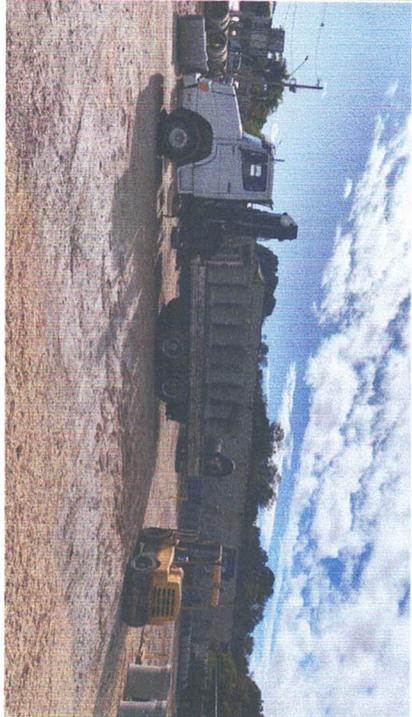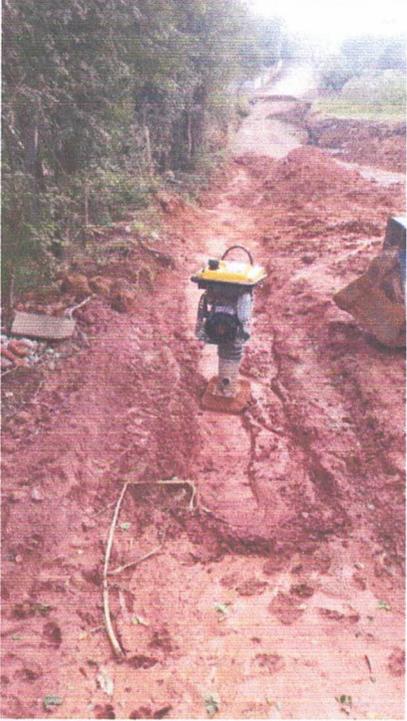





A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is located in the bottom right corner of the page.

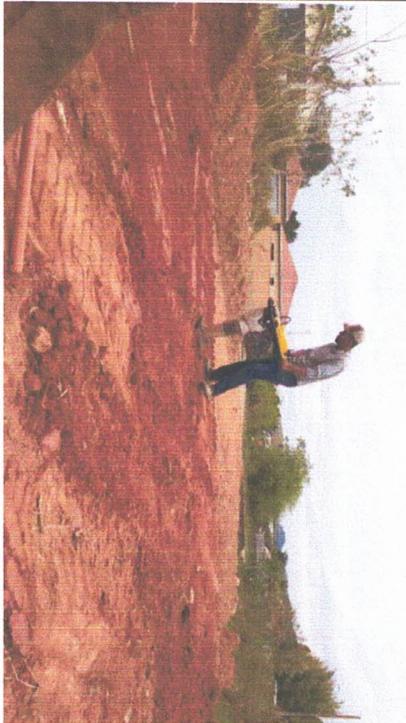

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

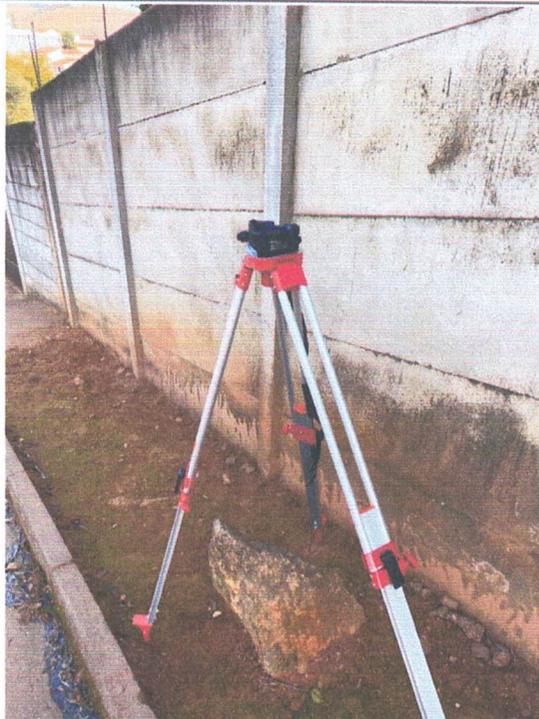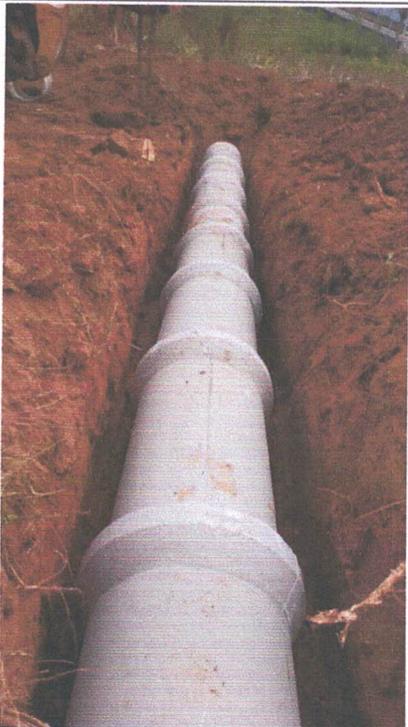

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

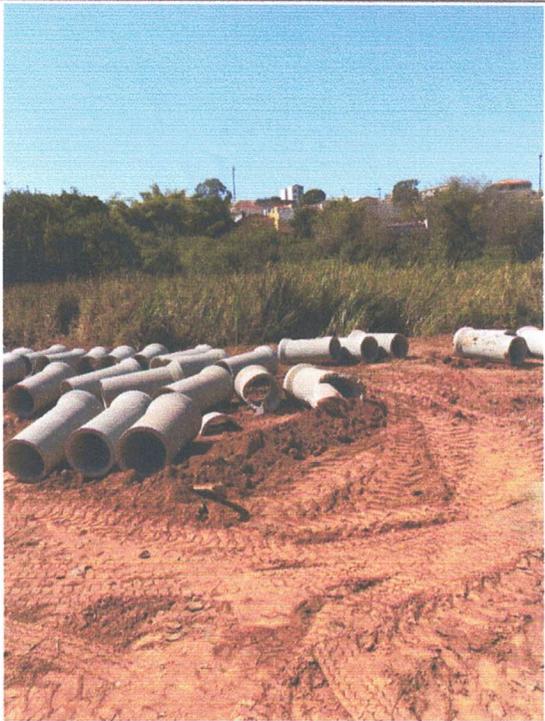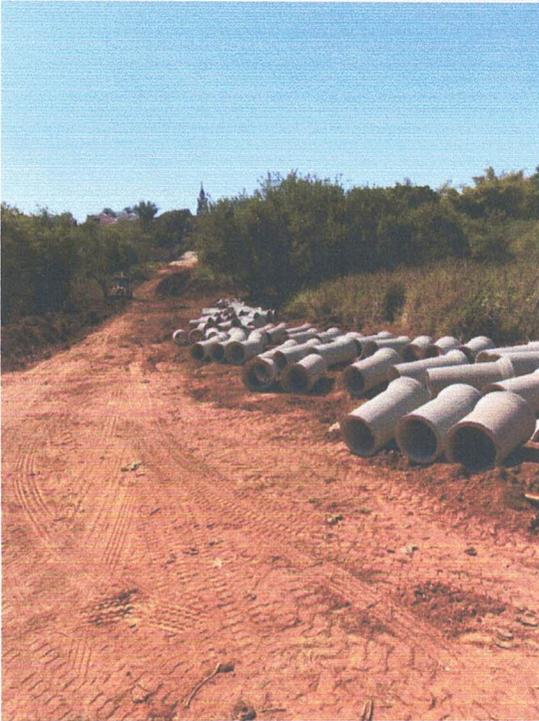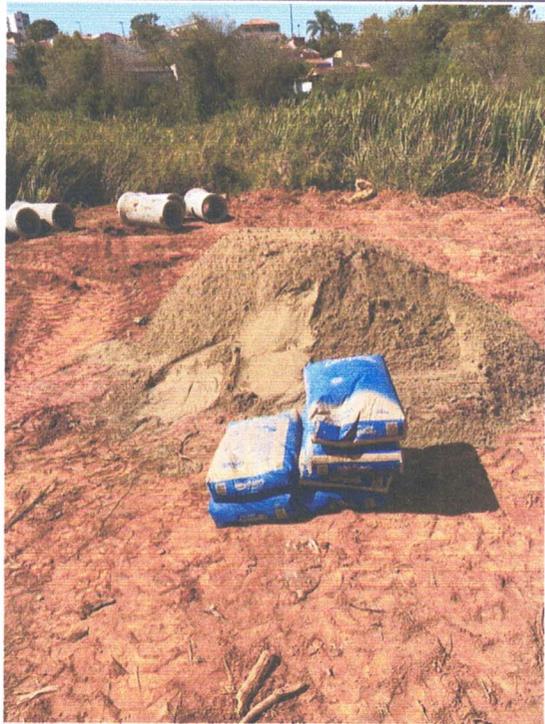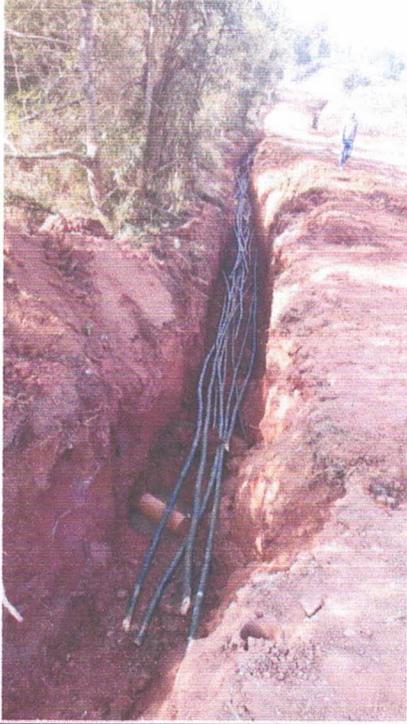

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Assinatura

\_\_\_\_\_

Assinatura
