

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados

LOCAL: Rua Sebastião Pires Ribeiro / Rua Bueno Brandão

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA

CONTRATO Nº 089/2021

CNPJ 32.091.094/0001-48

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/09/2022 a 26/09/2022


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONTRATO		MEDIÇÃO 1		SALDO	
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT.		PREÇO TOTAL
	CONTRATO			R\$ 194.190,13					
	SALDO ANTERIOR			R\$ 194.190,13					
	MEDIÇÃO 01			R\$ 194.190,13					
	SALDO			R\$ 0,00					
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8 - EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM FULCILPITO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	R\$ 1.121,47	R\$ 1.455,22	R\$ 1.455,22	1,00	R\$ 1.455,22	R\$ -
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS	UN	30,00	R\$ 75,00	R\$ 97,32	R\$ 2.919,60	30,00	R\$ 2.919,60	R\$ -
2	OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)								
2.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.715,20	R\$ 74,95	R\$ 97,25	R\$ 166.805,73	1715,20	R\$ 166.805,73	R\$ -
3	DRENAAGEM								
3.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	504,50	R\$ 35,15	R\$ 45,61	R\$ 23.009,59	504,50	R\$ 23.009,59	R\$ -
	VALOR TOTAL DO CONTRATO			R\$ 194.190,13				R\$ 194.190,13	R\$ 0,00

BORDA DA MATA, 27 DE SETEMBRO DE 2022

CONSTRUTORA
CARVALHO E DUARTE
LTD.A:32091094000148

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CARVALHO E
DUARTE LTD.A:32091094000148
Dados: 2022.09.28 09:00:43
-03'00"

APROVADO
Data: 21/10/22 Decreto: /
Depto. Engenharia
Prefeitura Municipal
Borda da Mata

			Relatório n°	8	
			Data do relatório	09/09/2022 - 26/09/2022	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	089
Obra	089 Pavimentação borda da mata			Prazo contratual	93 dias
Local	Rua Sebastião Pires Ribeiro			Prazo decorrido	36 dias
Contratante	Prefeitura borda da mata	Responsável	Guilherme	Prazo a vencer	57 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (1)					
Servente					Terceiros (1)
1					

Equipamentos (34)						
Betoneira	Carinho de mão	Colher de pedreiro	Desempenadeira	Enxada	GNSS GPS RTK	Marreta
1	3	3	4	4	1	3
Picareta	Placa vibratória	Pá	Regua pedreiro	Retro Escavadeira	Trena 5m	Vassoura
4	1	3	2	1	1	1
disco de corte	sapo compactador de solo					
1	1					

Atividades (4)	
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	100% - Concluída
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	100% - Concluída
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	100% - Concluída
EXECUÇÃO DE MEIO FIO	100% - Concluída


Ocorrências (0)

Comentários (0)


Galeria de Fotos (36)




PLACA DE OBRA

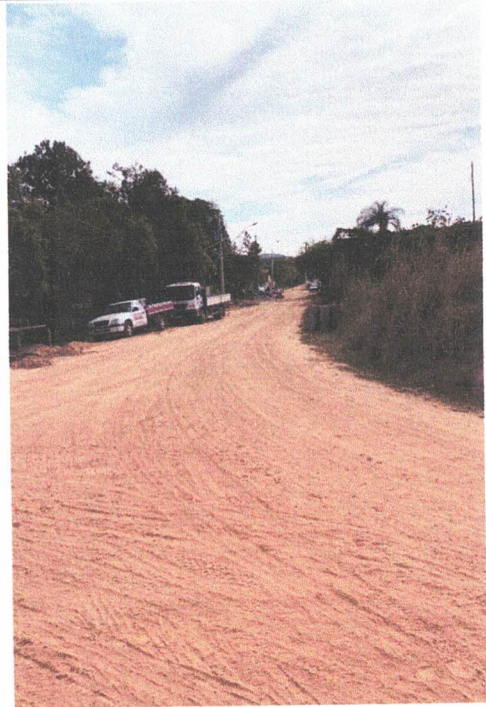


RUA SEBASTIAO PIRES RIBEIRO

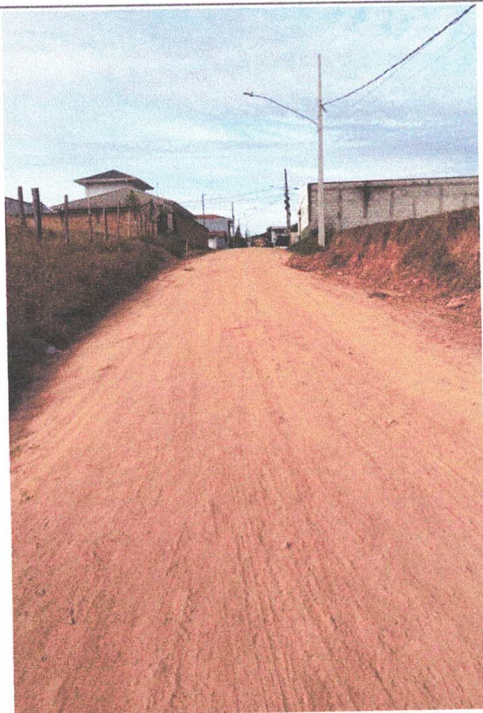

RUA BUENO BRANDÃO

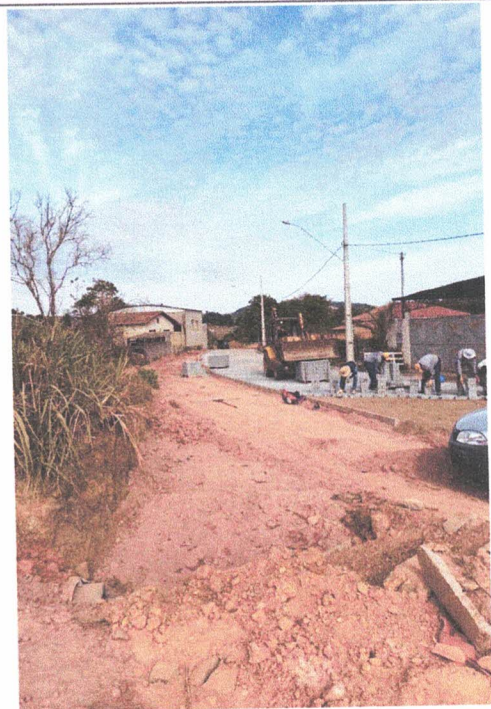


PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

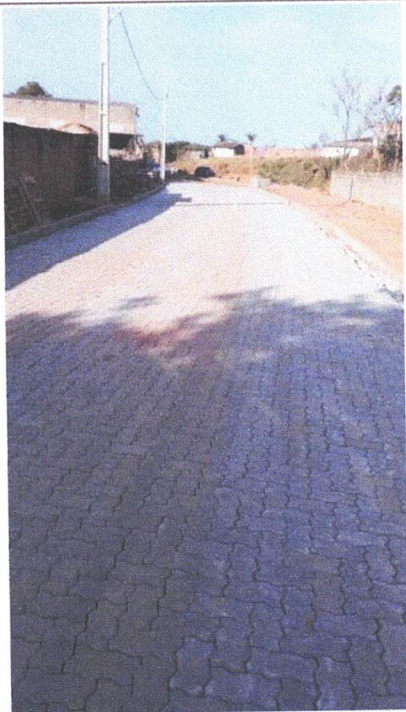


PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO



PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

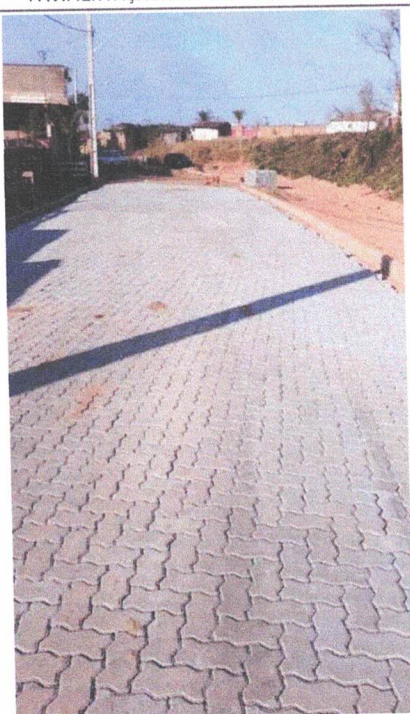


PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

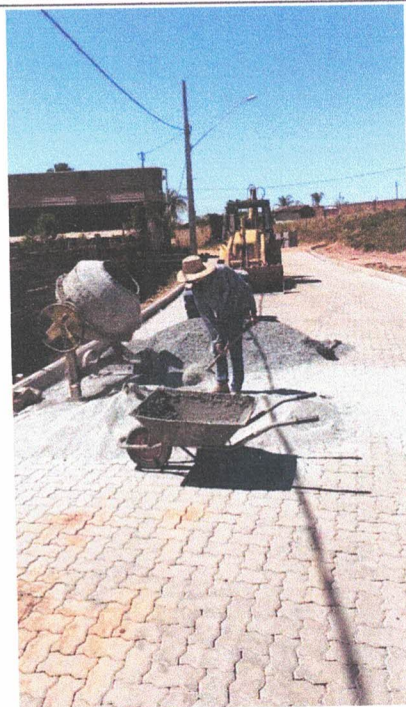


EXECUÇÃO DE CONCRETO PARA SARJETA



PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

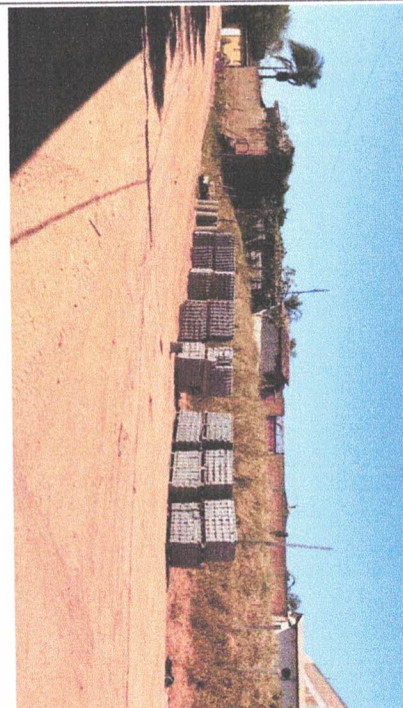

PISO INTERTRAVADO EM ESTOQUE NA OBRA

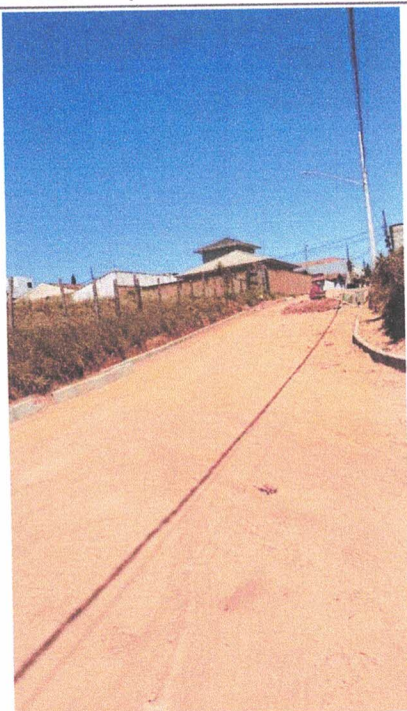


ASSENTAMENTO DE MEIO FIO






MARCAÇÃO TOPOGRAFICA

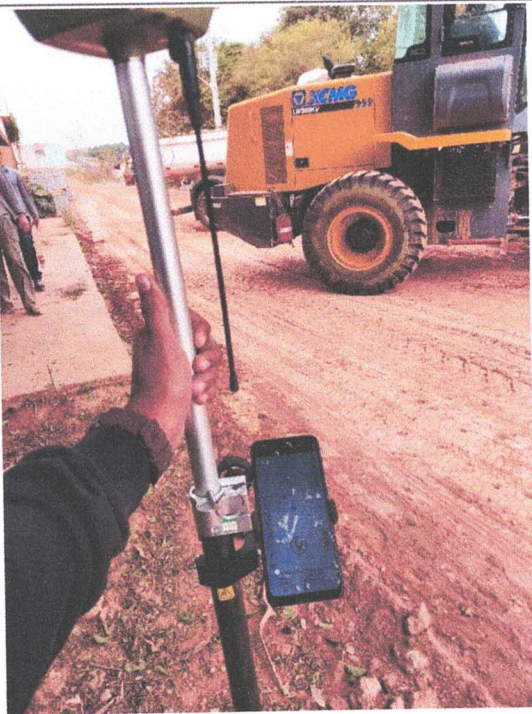

MARCAÇÃO TOPOGRAFICA

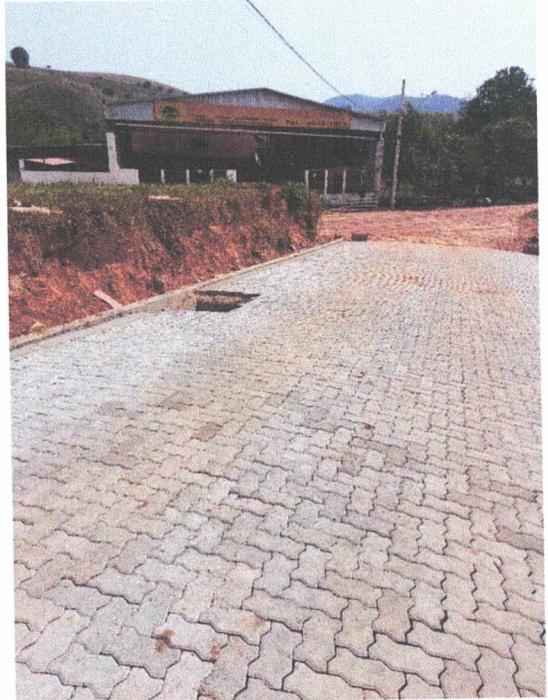


PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO



PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO



MARCAÇÃO TOPOGRAFICA

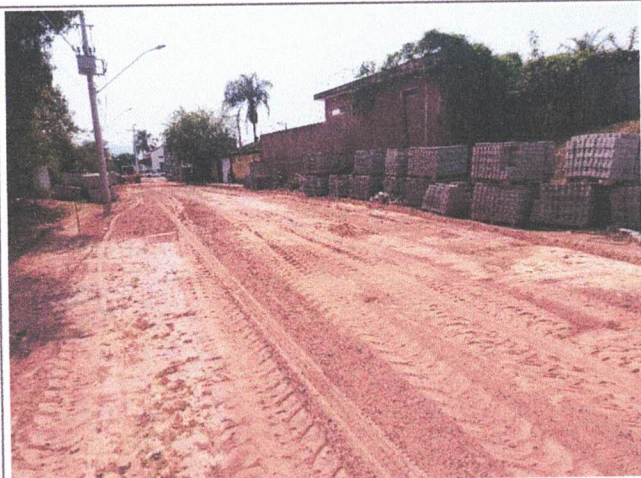


REGUALIZAÇÃO DO SUB-LEITO






ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

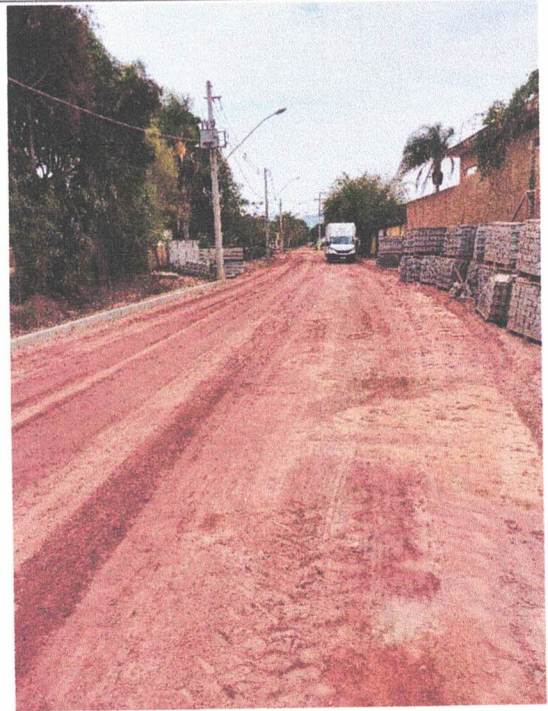


REGUALIZAÇÃO DO SUB-LEITO



EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

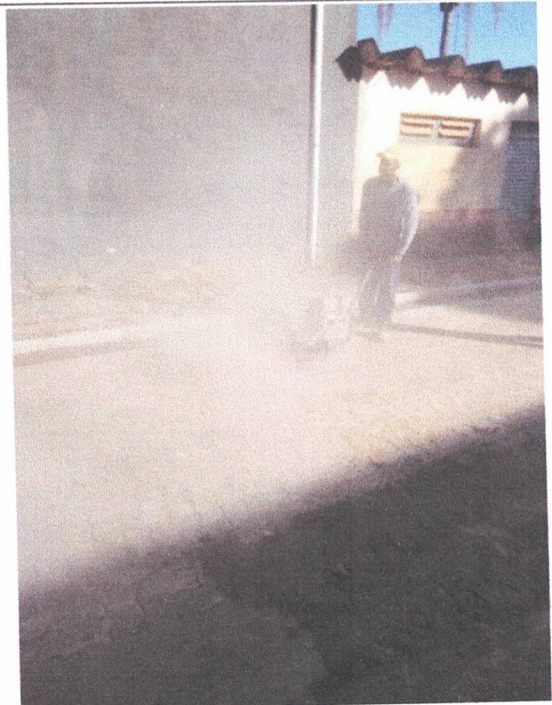


PLACA VIBRATÓRIA

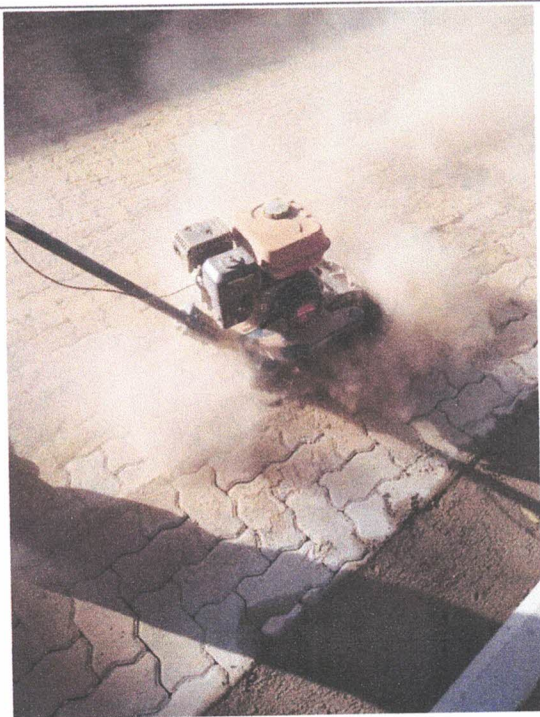

PLACA VIBRATÓRIA




PLACA VIBRATÓRIA

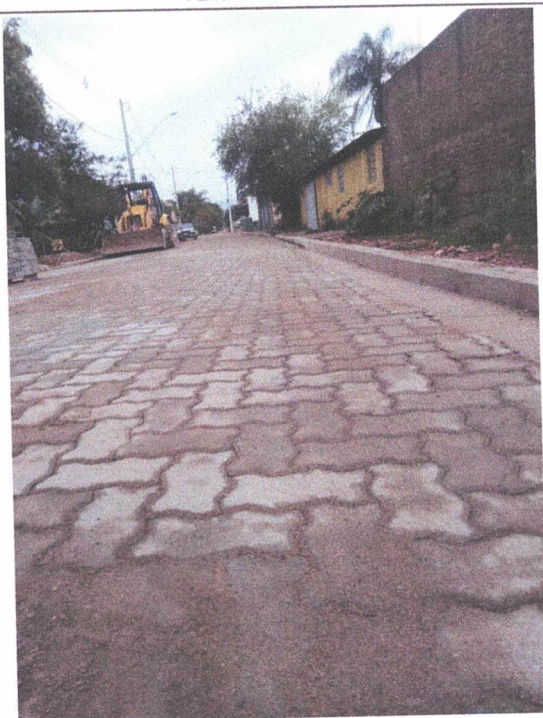


EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVDO



EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVDO

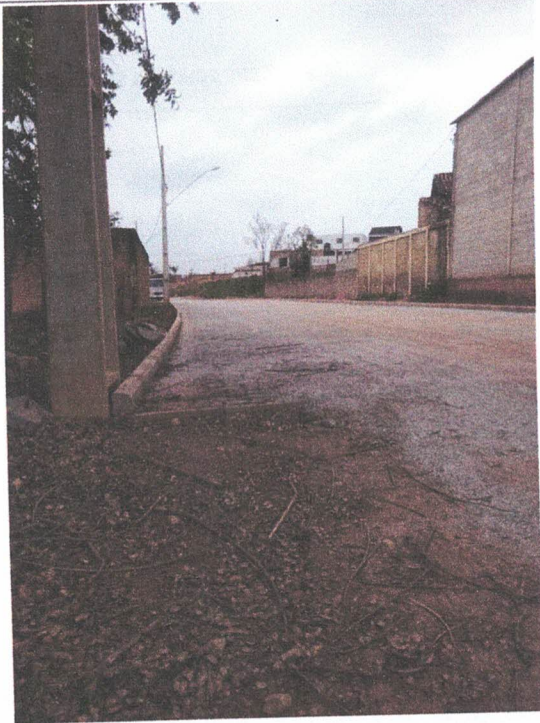

RUA SEBASTIAO PIRES RIBEIRO PAVIMENTAÇÃO CONCLUIDA

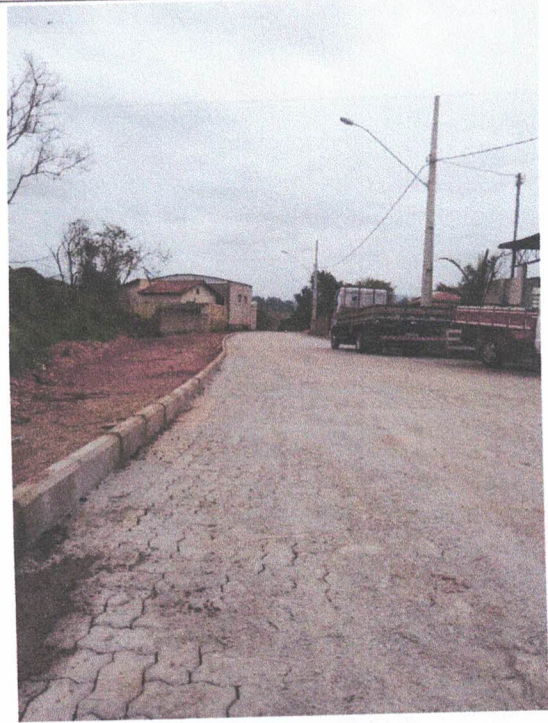

RUA SEBASTIAO PIRES RIBEIRO PAVIMENTAÇÃO CONCLUIDA



RUA SEBASTIAO PIRES RIBEIRO PAVIMENTAÇÃO CONCLUIDA



RUA SEBASTIAO PIRES RIBEIRO PAVIMENTAÇÃO CONCLUIDA
