



CONSTRUTORA EFERCON EIRELI EPP

CNPJ: 18.449.040/0001-80 IE: 002180871.00-45

Av. Edna Maria da Silva Ribeiro nº 173, Sala 1, Santa Rita

Borda da Mata - MG CEP: 37564-000

E-mail: [construtoraefercon@yahoo.com.br](mailto:construtoraefercon@yahoo.com.br)

À

Prefeitura Municipal de Borda da Mata

Estado de Minas Gerais

Ref.: Processo Licitatório 834/2021

Concorrência 005/2021

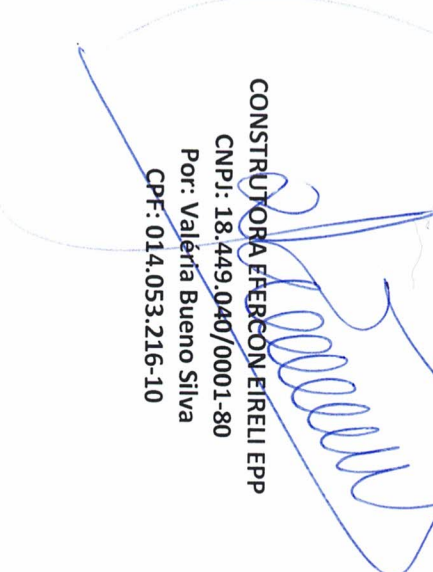
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS NA RUA BENEDITO RODRIGUES – TRAV. JOÃO O. MEGALE

BOELTIM DE MEDIÇÃO Nº1 PERÍODO 09/06/2022 ATÉ 08/07/2022

ITEM	CÓDIGO SETOP MARÇO 2022	SEINFRA MARÇO 2022	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO TOTAL C/ LDI	% EXECUTADO	R\$ EXECUTADO
1	IIO-001		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					
1.1	IIO-PLA-005	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.617,08	100,00%	R\$ 1.617,08
1.2	LOC-TOP-010	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UN	20	1.965,80		R\$ -
2	OBR-001		<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>					
2.1	OBR-VIA-217	ED-50418	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	809,00	79.006,94	100,00%	R\$ 79.006,94

3	DRE-001		DRENAGEM						
3.1	DRE-SAR-025	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	247,00	12.312,95	100,00%	R\$ 12.312,95	
4			ACESSIBILIDADE						
4.1	RO-42283		PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUNDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	25,4	1.446,78		R\$ -	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>						<b>96.349,55</b>		<b>92.936,97</b>	

Borda da Mata – MG, 11 de julho de 2022.

  
**CONSTRUTORA FERCON EIRELI EPP**  
 CNPJ: 18.449.040/0001-80  
 Por: Valéria Bueno Silva  
 CPF: 014.053.216-10
